2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 실시설계도

◎ 위　　치 : 전라북도 진안군 용담면 송풍리 일대

◎ 사 업 량 : 52.71 ha

진안군산림조합

2018년 선도산림경영단지(풀베기 1차) 대 상 지 조 서

임소반	임야소재지					조림상황		사업면적(ha)	ha당본수	소유권자(이해관계인)		도면번호
	면	리	산번지			년도	수종			주 소	성명	
총 계				22필지				52.71				
임반계				22필지				52.71				
소반계				3필지				1.49				
1-0-1	용담	송풍	산	288	1	2015	고로쇠	0.24	600			1
	용담	송풍	산	289	1		고로쇠	0.05	600			1
	용담	송풍	산	289	2		고로쇠	1.20	600			1
소반계				3필지				3.56				
1-0-2	용담	송풍	산	148	3	2015	편백	1.50	1,500			2
	용담	송풍	산	84			편백	2.00	1,500			2
	용담	송풍	산	84	10		편백	0.06	1,500			2
소반계				11필지				17.68				
1-0-3	용담	송풍	산	148	4	2015	낙엽송	7.30	1,500			2
	용담	송풍	산	148	4		상수리	4.00	1,500			2
	용담	송풍	산	16			상수리	1.30	1,500			4
	용담	송풍	산	287			상수리,두릅	0.96	1,500			1
	용담	송풍	산	288	1		상수리,두릅	0.88	1,500			1
	용담	송풍	산	289	2		상수리	1.16	1,500			1
	용담	송풍	산	29			엄나무	0.15	1,500			3
	용담	송풍	산	292	1		상수리	1.16	1,500			1
	용담	송풍	산	36			엄나무	0.10	1,500			3
	용담	송풍	산	37			엄나무	0.03	1,500			3
	용담	송풍	산	38			엄나무	0.24	1,500			3
	용담	송풍	산	39			엄나무	0.40	1,500			3
소반계				5필지				11.70				
1-0-4	용담	송풍	산	134		2016	편백	1.80	1500			2
	용담	송풍	산	148	7		편백	1.67	1500			2
	용담	송풍	산	156			편백	3.63	1500			5
	용담	송풍	산	156	1		편백	2.35	1500			5
	용담	송풍	산	156	2		편백	2.25	1500			5
소반계				1필지				1.20				
1-0-5	용담	송풍	산	161	2	2017	밤나무	1.20	400			5
소반계				1필지				1.30				
1-0-6	용담	송풍	산	150	4	2017	편백	0.25	1,500			5
	용담	송풍	산	161	2	2017	편백	1.05	1,500			5
소반계				2필지				7.47				
1-0-7	용담	송풍	산	114		2018	편백	1.21	1500			2
	용담	송풍	산	163		2018	편백	6.26	1500			5
소반계				1필지				6.41				
1-0-8	용담	송풍	산	163		2018	백합	6.41	2,000			5
소반계				1필지				1.90				
1-0-9	용담	송풍	산	114		2018	낙엽송	1.90	2,000			2

위 치 도



GANGSAN

(유)강산엔지니어링

전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3

Tel:063-432-0174

Fax:063-228-4176

E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도삼림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명


위 치 도

DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/25,000	위 치-01

표준지배치도 및 작업지시도

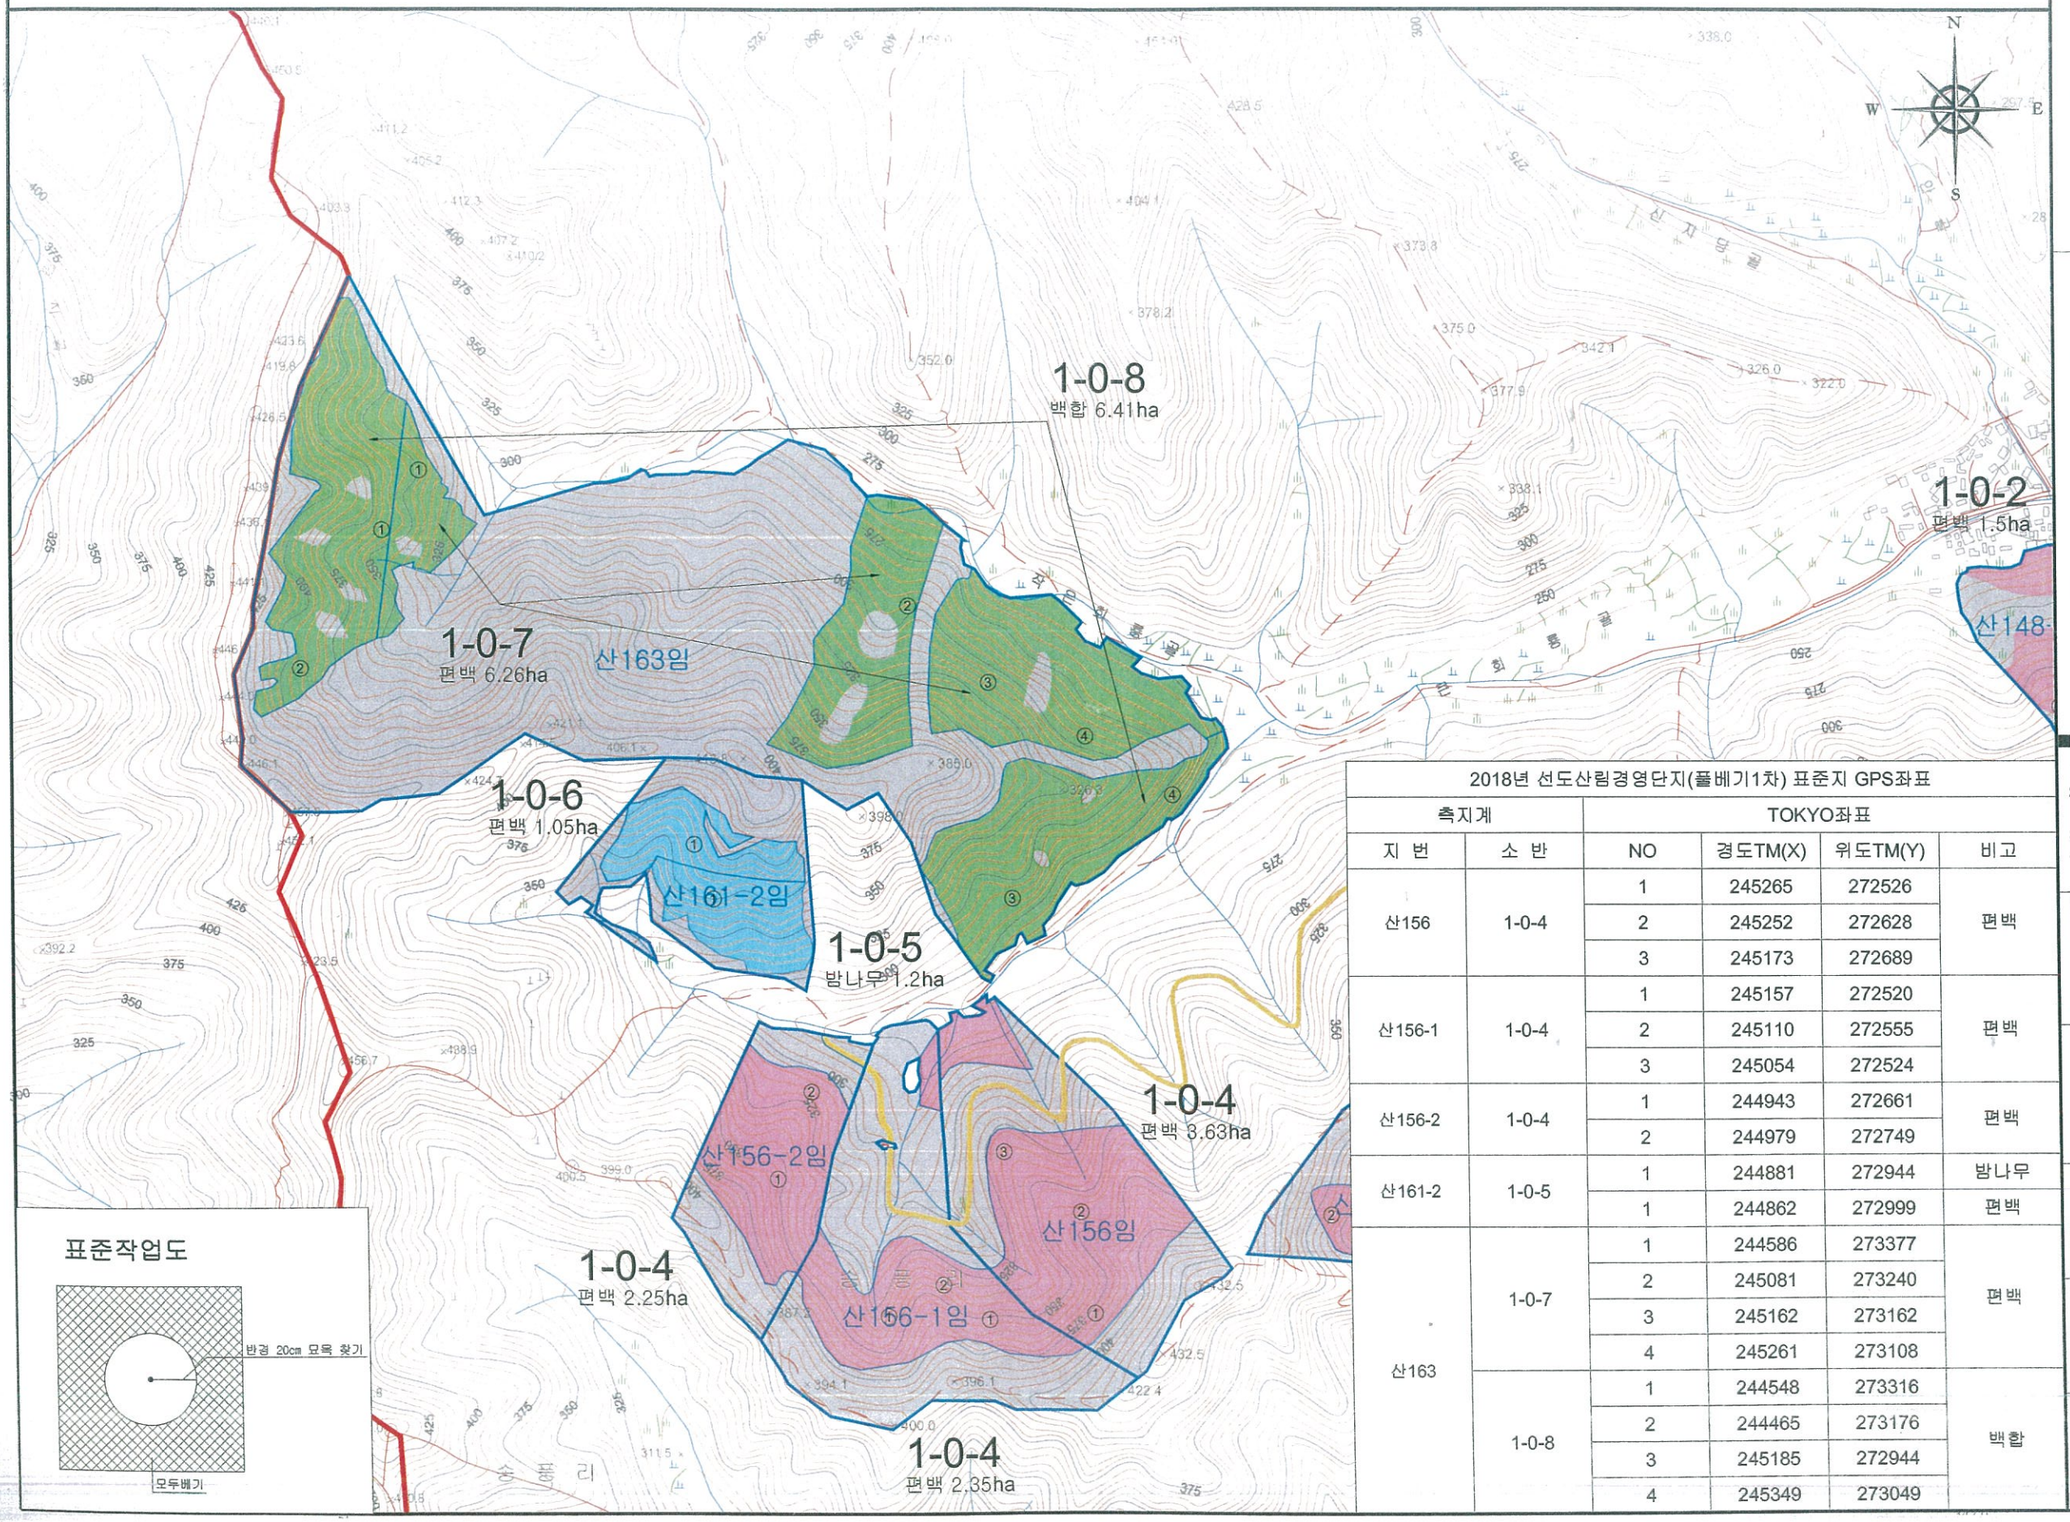

2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산156	1-0-4	1	245265	272526	편백
		2	245252	272628	
		3	245173	272689	
산156-1	1-0-4	1	245157	272520	편백
		2	245110	272555	
		3	245054	272524	
산156-2	1-0-4	1	244943	272661	편백
		2	244979	272749	
산161-2	1-0-5	1	244881	272944	밤나무
		1	244862	272999	편백
산163	1-0-7	1	244586	273377	편백
		2	245081	273240	
		3	245162	273162	
		4	245261	273108	
	1-0-8	1	244548	273316	백합
		2	244465	273176	
		3	245185	272944	
		4	245349	273049	

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭
2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)


DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술1급 이정래

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-05

표준지배치도 및 작업지시도

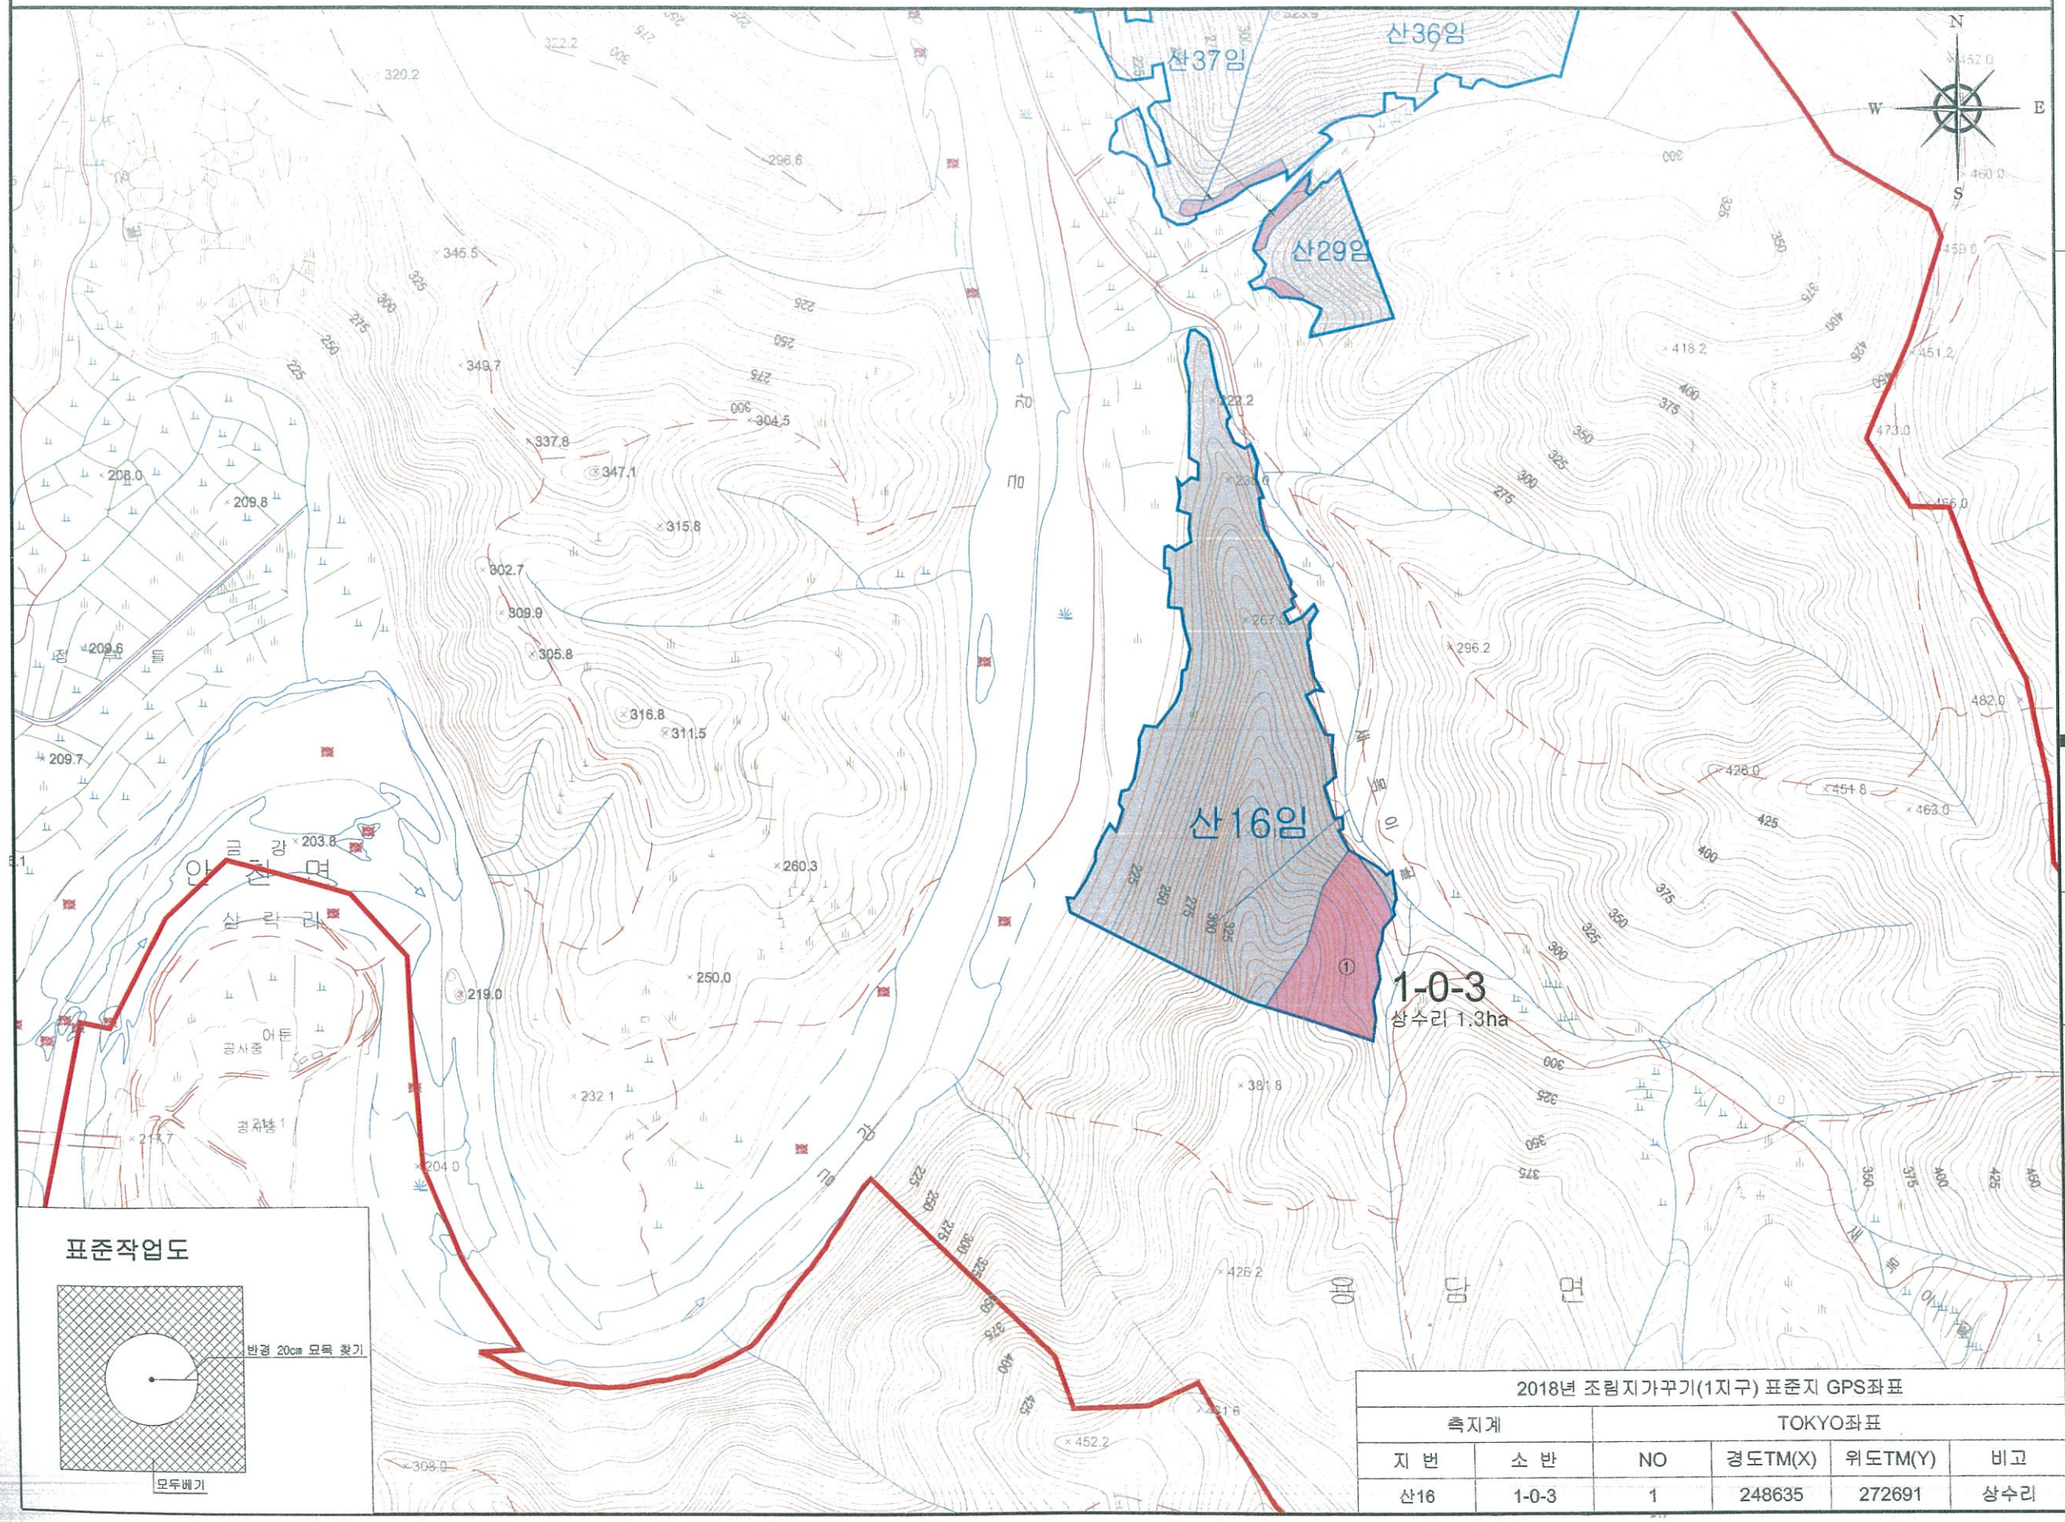

표준작업도

2018년 조림지가꾸기(1지구) 표준지 GPS좌표					
측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산16	1-0-3	1	248635	272691	상수리

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낮으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭
2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)


DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자 기술1급 이정래

SCALE.
A3= 1/6,000

DRAWING NO.
도 면-04

표준지배치도 및 작업지시도

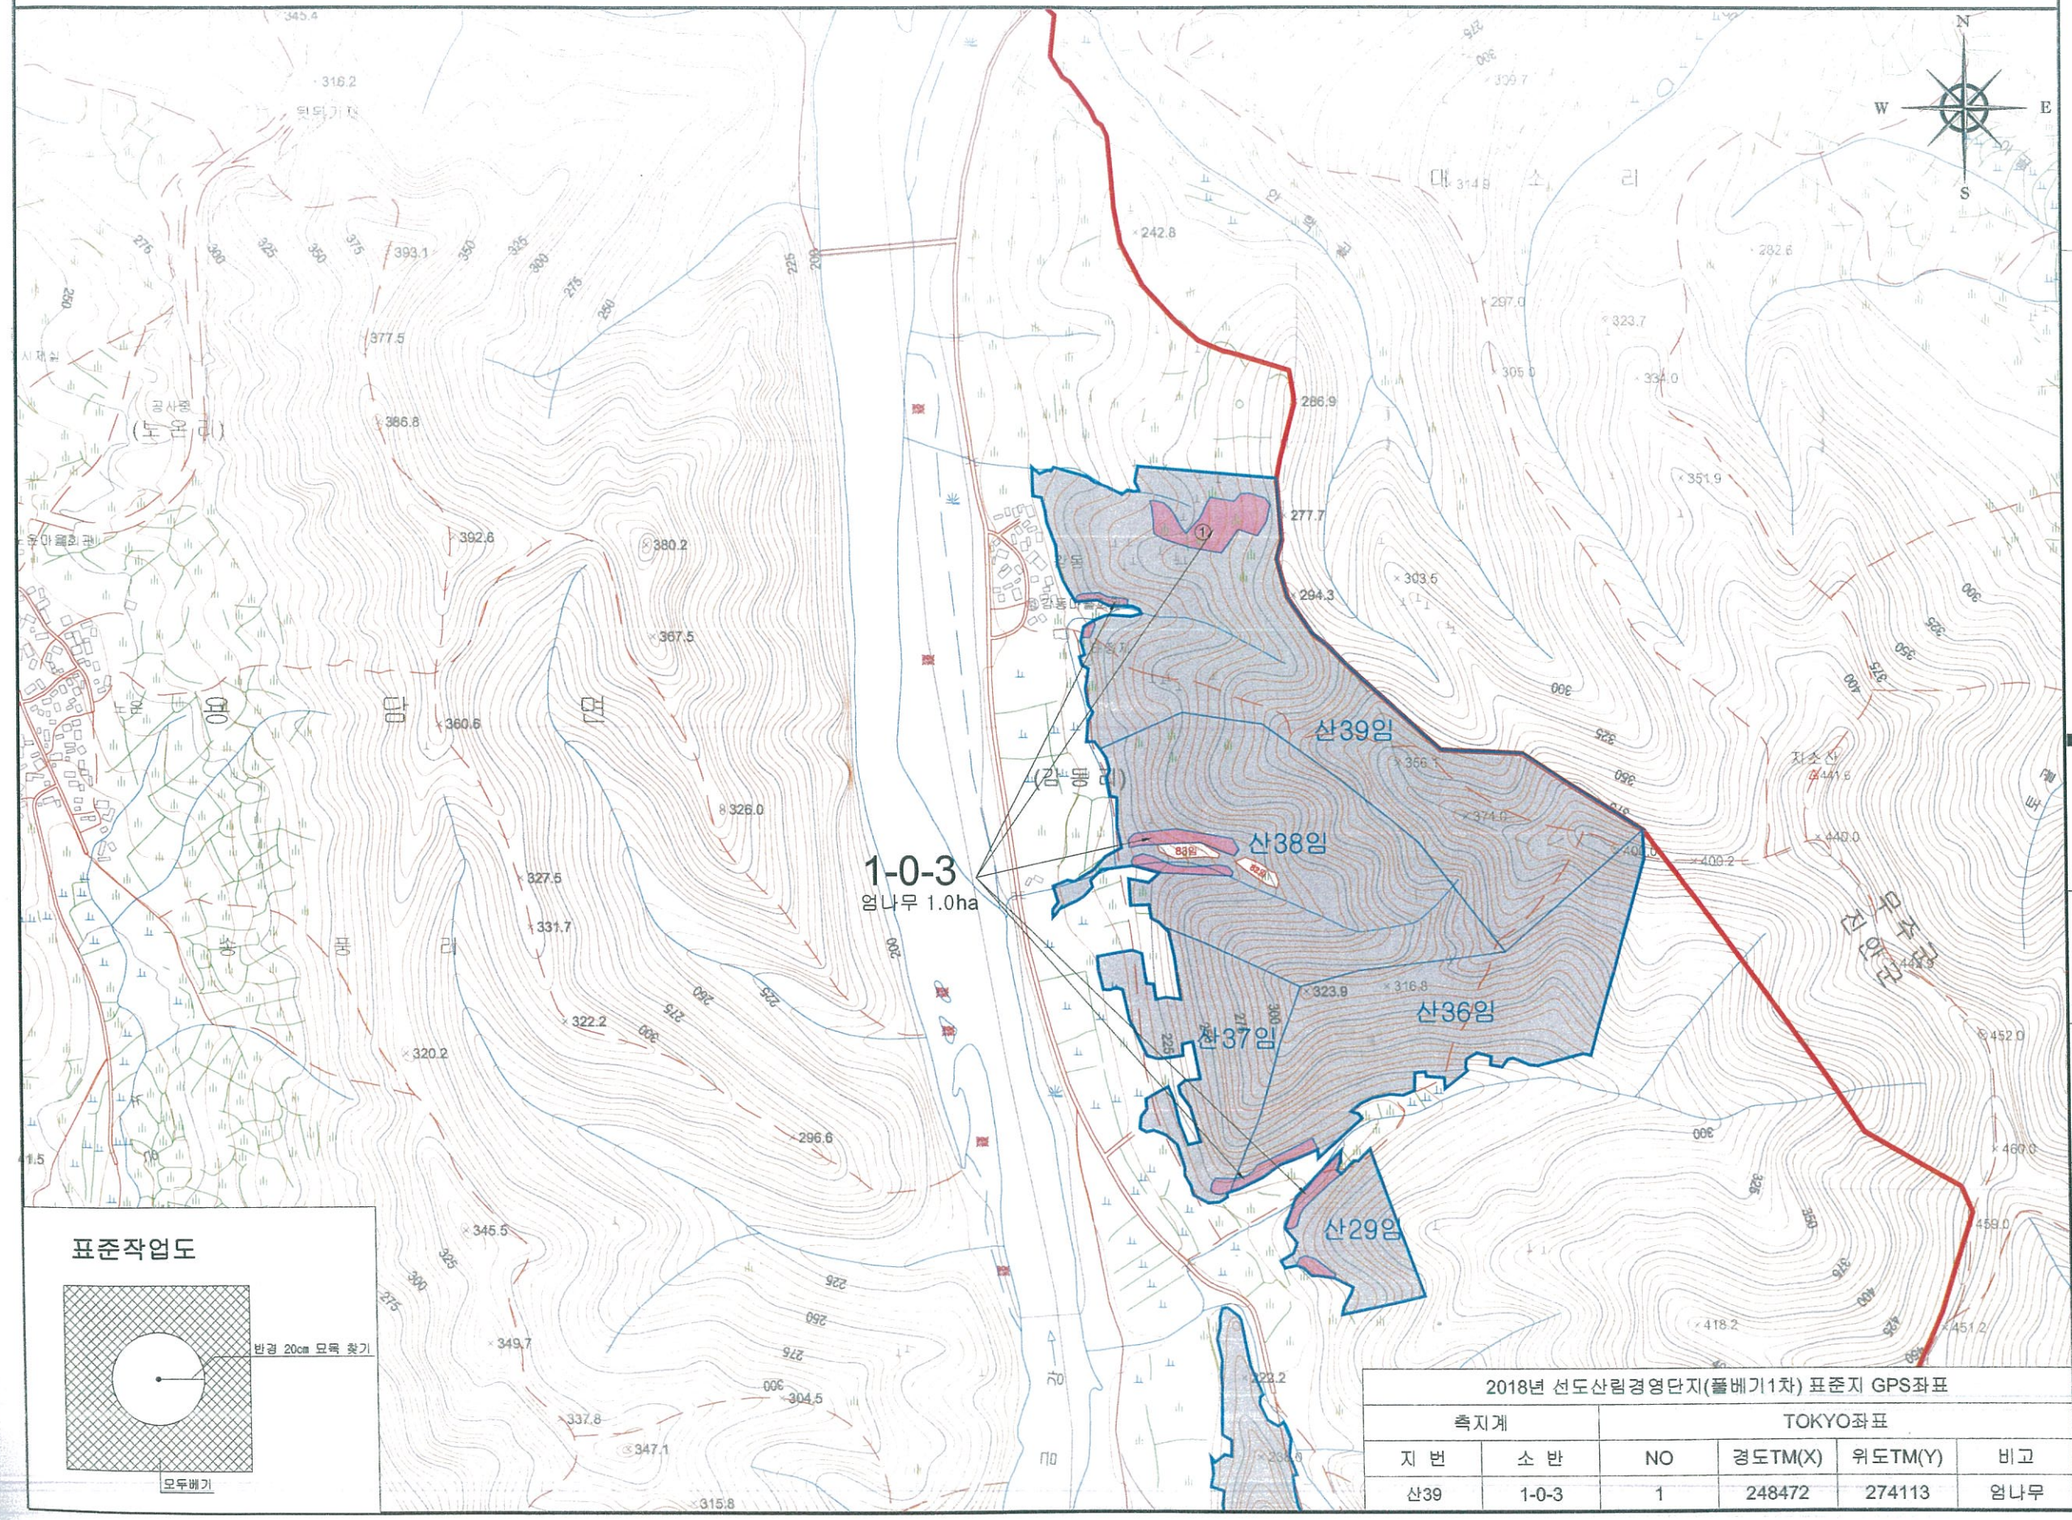

표준작업도

2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표					
측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산39	1-0-3	1	248472	274113	엄나무

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihiand@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도


DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-03

표준지배치도 및 작업지시도

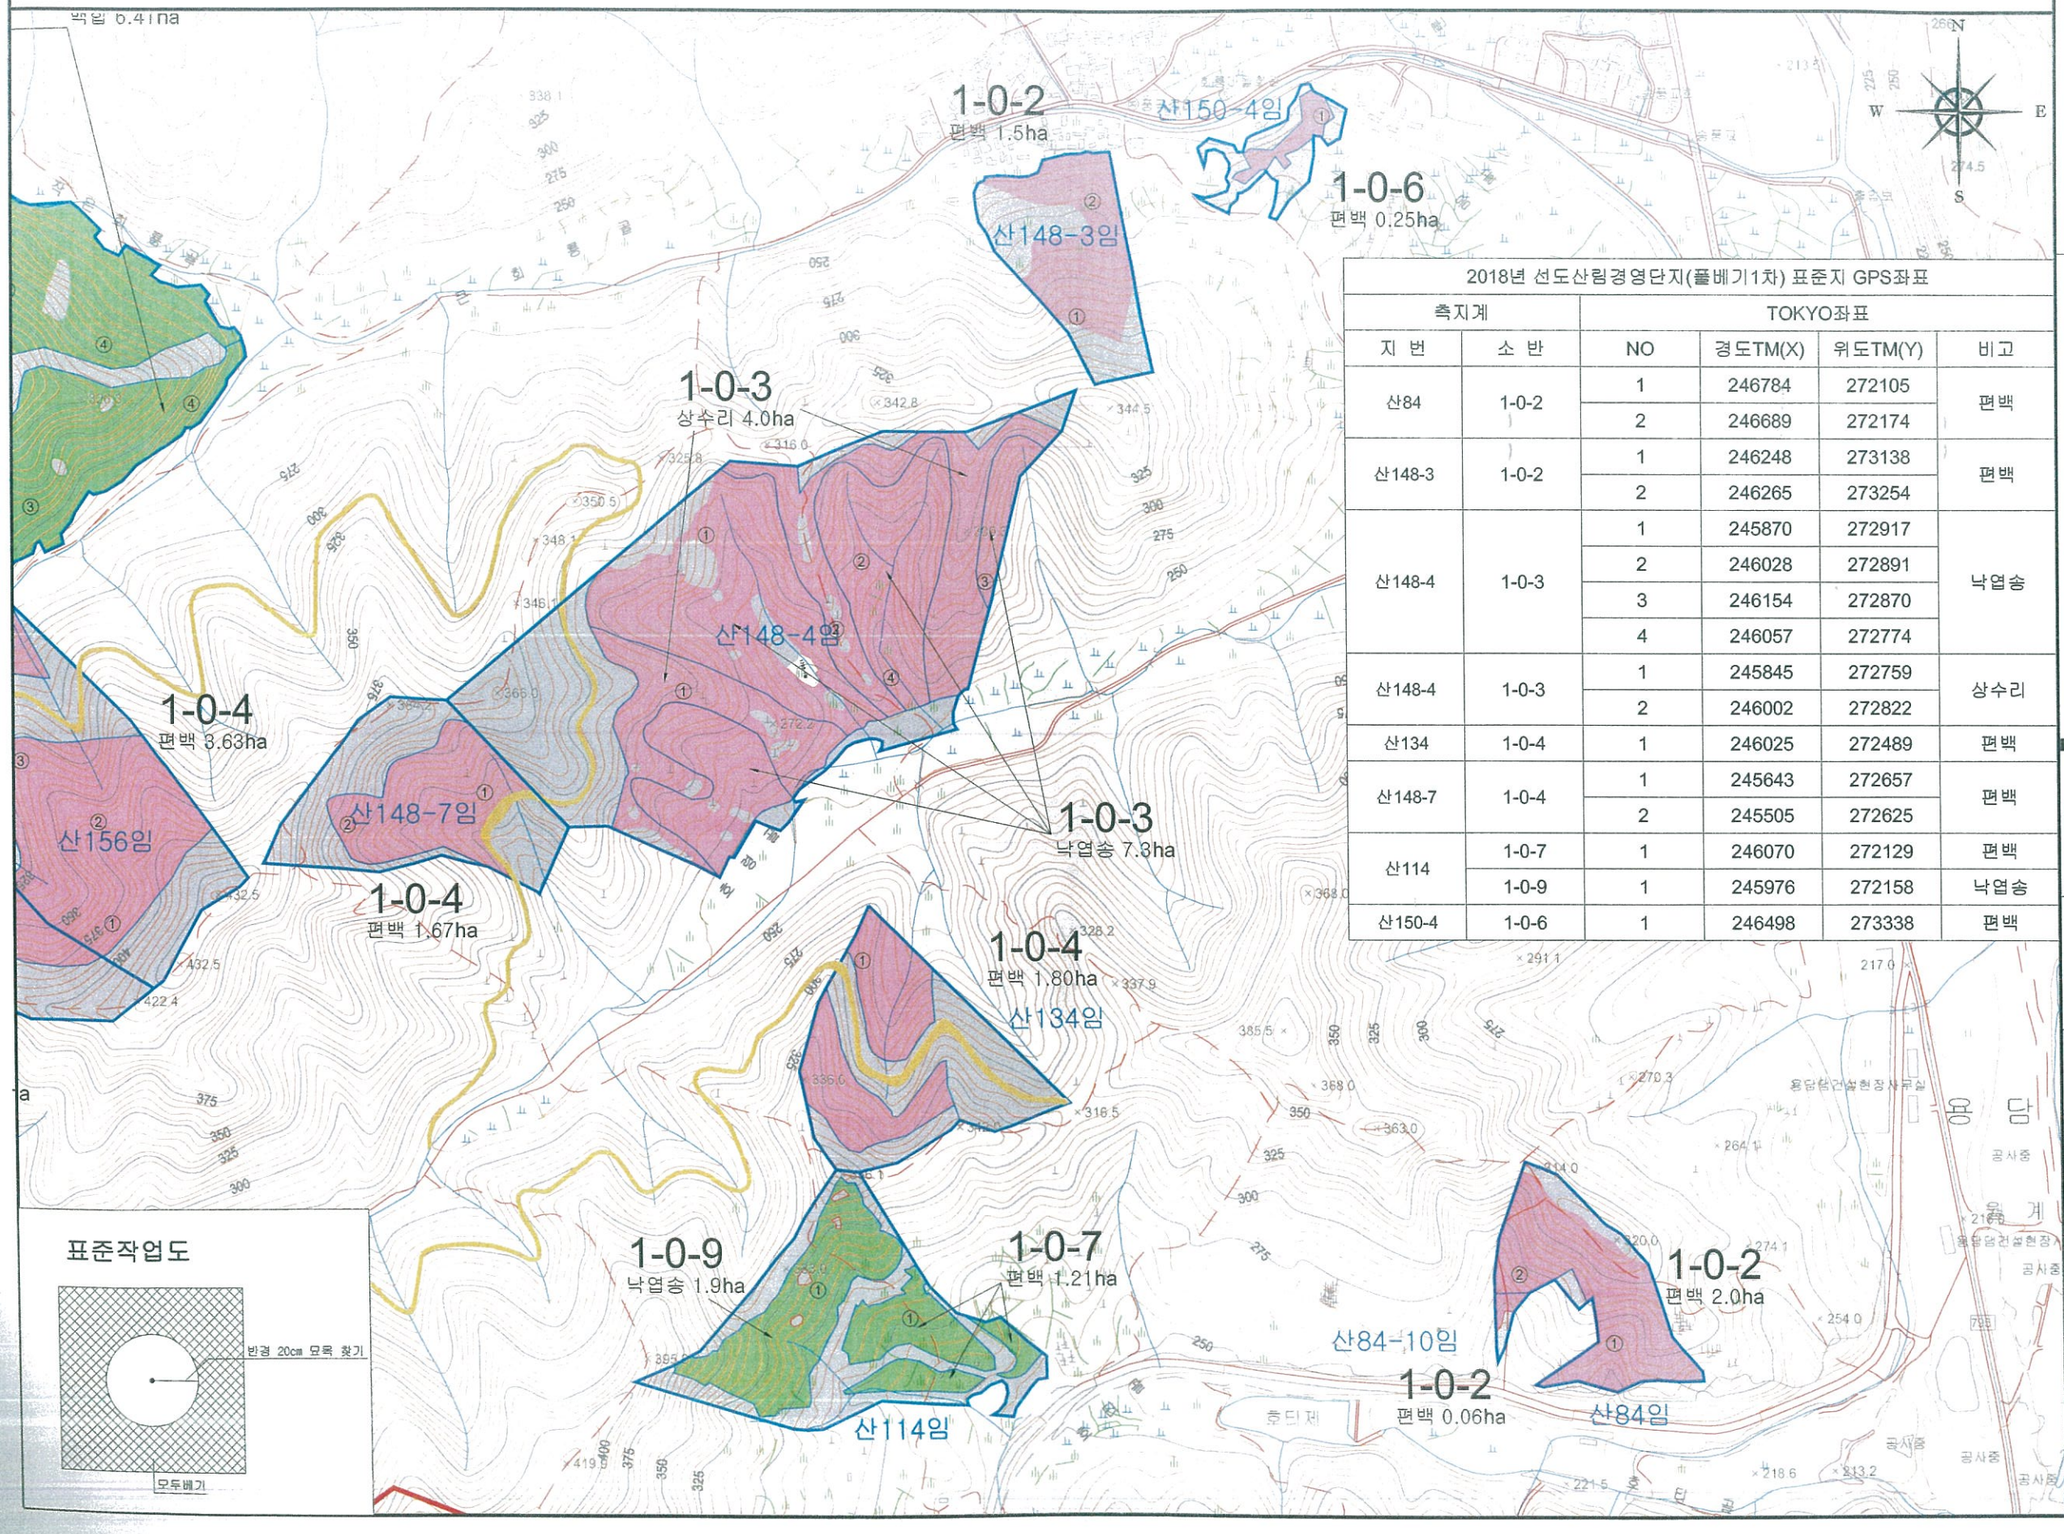

2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산84	1-0-2	1	246784	272105	편백
		2	246689	272174	
산148-3	1-0-2	1	246248	273138	편백
		2	246265	273254	
산148-4	1-0-3	1	245870	272917	낙엽송
		2	246028	272891	
		3	246154	272870	
		4	246057	272774	
산148-4	1-0-3	1	245845	272759	상수리
		2	246002	272822	
산134	1-0-4	1	246025	272489	편백
산148-7	1-0-4	1	245643	272657	편백
		2	245505	272625	
산114	1-0-7	1	246070	272129	편백
	1-0-9	1	245976	272158	낙엽송
산150-4	1-0-6	1	246498	273338	편백

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도


DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-02

표준지배치도 및 작업지시도

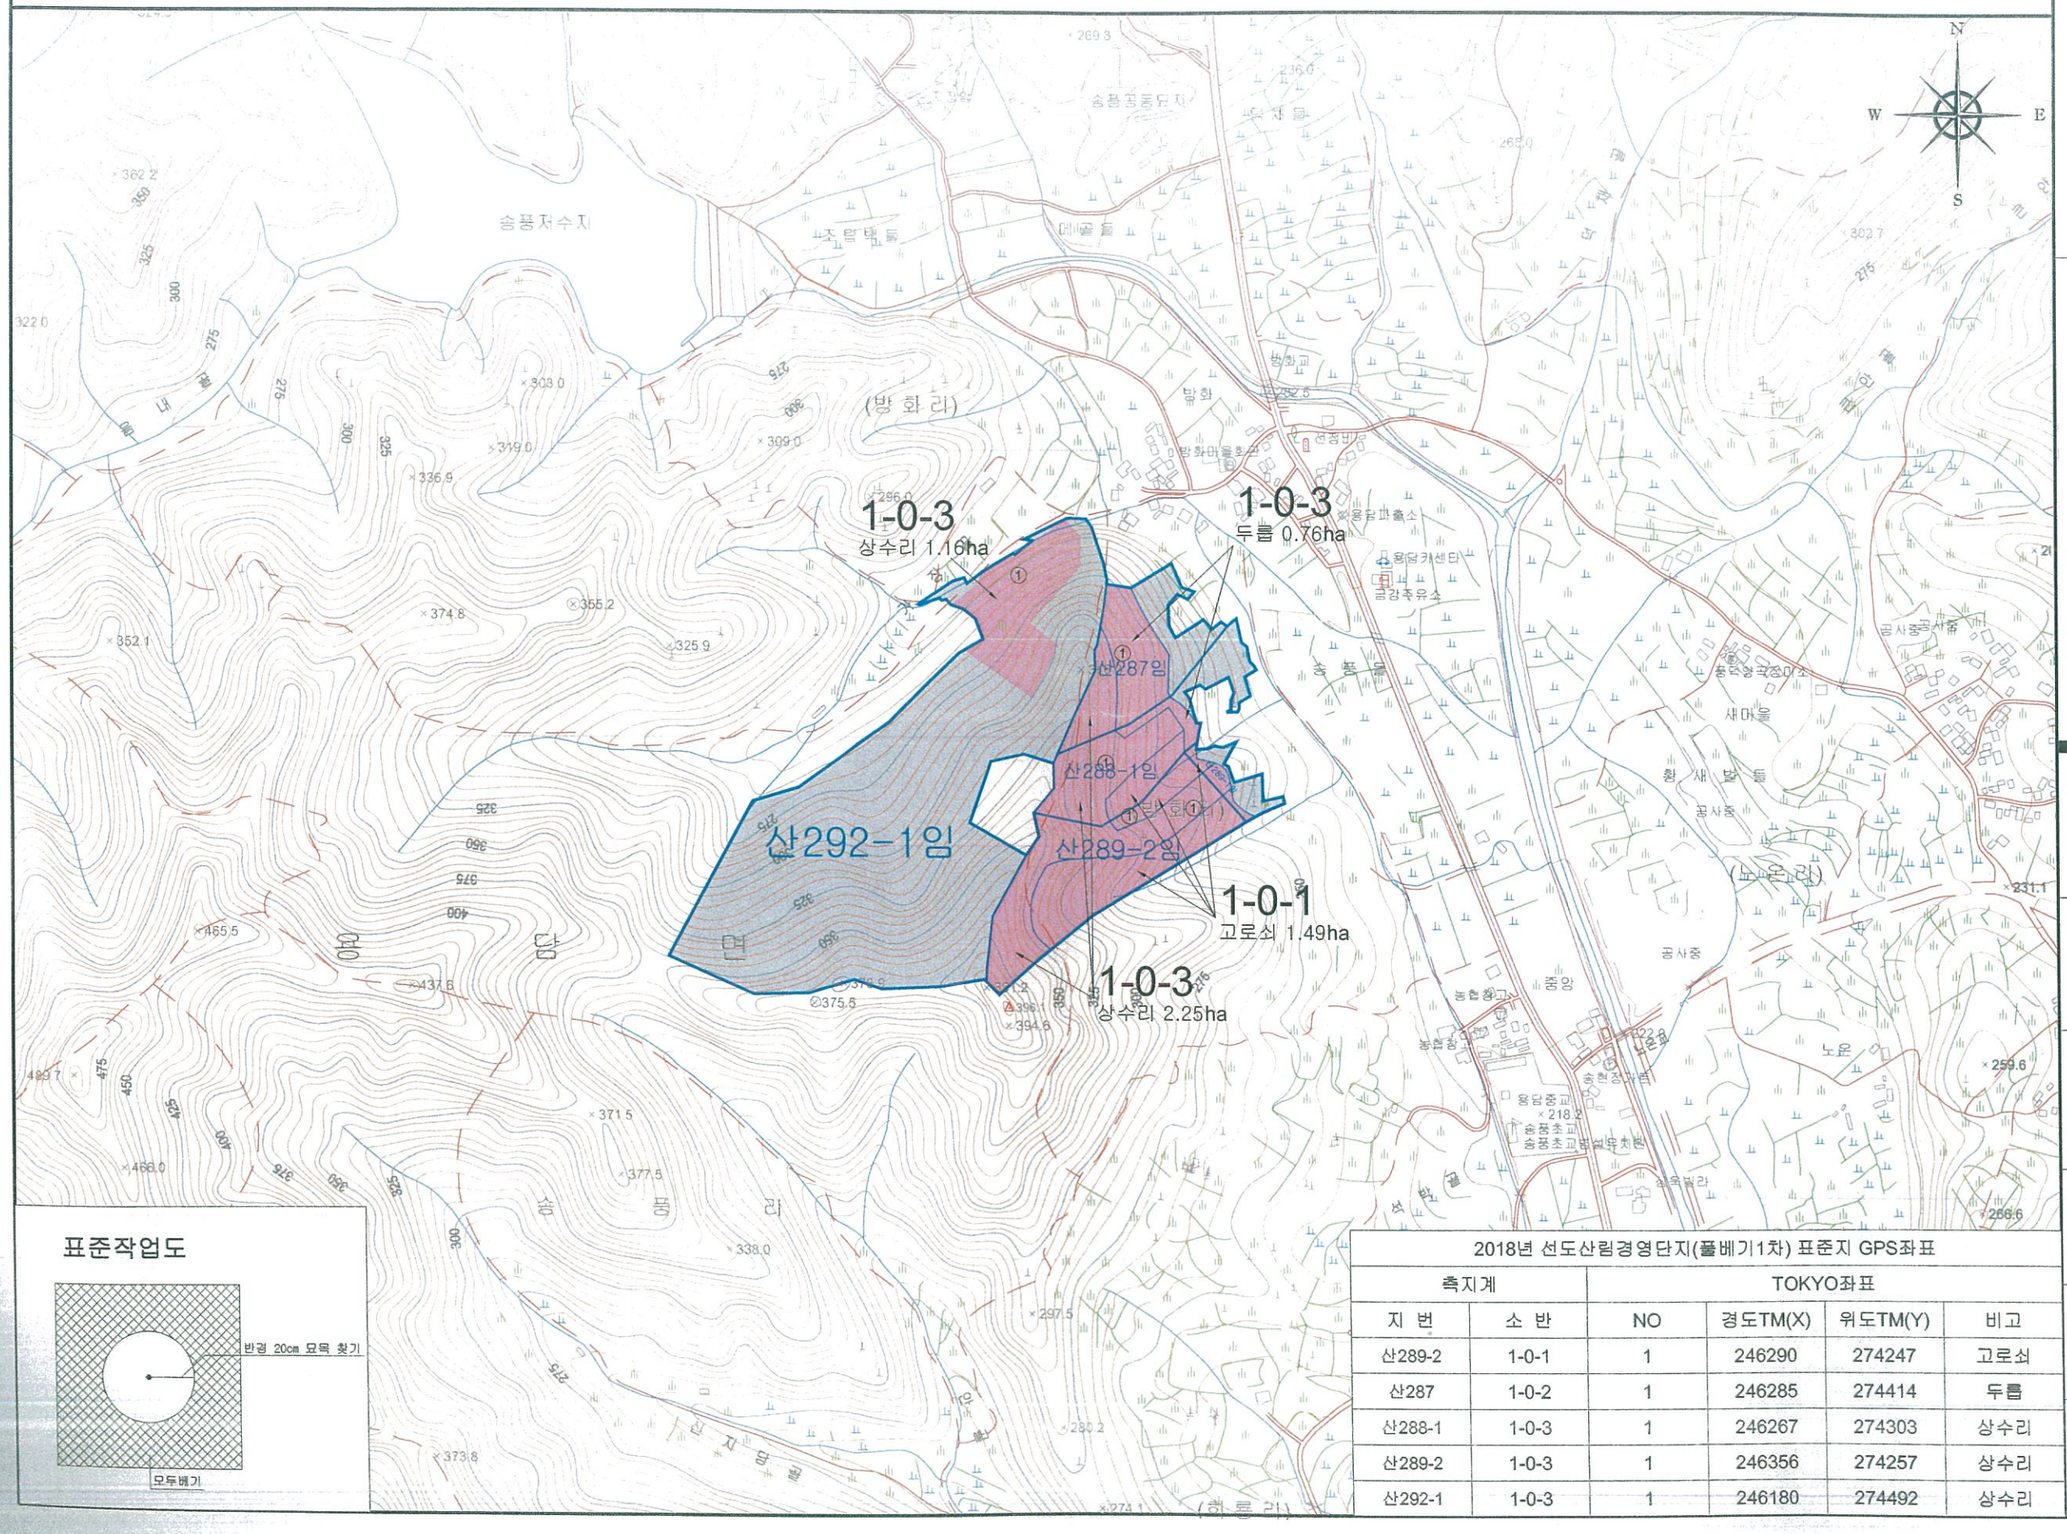

표준작업도

2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산289-2	1-0-1	1	246290	274247	고로쇠
산287	1-0-2	1	246285	274414	두릅
산288-1	1-0-3	1	246267	274303	상수리
산289-2	1-0-3	1	246356	274257	상수리
산292-1	1-0-3	1	246180	274492	상수리

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낮으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭
2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술1급 이정래

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-01
